



GAD PROVINCIAL
SANTO DOMINGO
DE LOS TSÁCHILAS

**INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO
HACEMOS - SECTOR CHIGUILPE”**

PERIODO JULIO 2019 – JULIO 2021

CALIDAD AMBIENTAL

NOVIEMBRE DE 2021

CONTENIDO

1.	FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	3
2.	ANTECEDENTES	3
3.	OBJETIVOS	3
3.1.	OBJETIVO GENERAL	3
3.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4.	ALCANCE.....	4
5.	METODOLOGÍA.....	4
6.	EVALUACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL PERIODO JULIO 2019 – JULIO 2021	4
7.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL REGISTRO AMBIENTAL PERIODO JULIO 2019 – JULIO 2021.	5
8.	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PERIODO JULIO 2019 – JULIO 2021. 6	
9.	INTERPRETACION DE RESULTADOS	7
10.	PLAN DE ACCIÓN	8
11.	CONCLUSIONES.....	8
12.	ANEXOS	8

1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS - SECTOR CHIGUILPE	
CÓDIGO DE PROYECTO:	MAE-RA-2016-251786	
NÚMERO DE RESOLUCIÓN:	No. 211005, 21 de julio de 2016	
PERIODO:	julio 2019 – julio 2021	
UBICACIÓN	Provincia:	Santo Domingo de los Tsáchilas
	Cantón:	Santo Domingo
	Parroquia:	Valle Hermoso
	Dirección:	Río Cómo Hacemos ubicado en el sector de Valle Hermoso
COORDENADAS DEL PROYECTO (WGS 84 ZONA 17 SUR):	X	Y
	692951	9992949
	692950	9992951
	692938	9992949
	692937	9992947
DATOS DEL PROPONENTE:	Razón Social: GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas	
	Representante Legal: Abg. Johana Núñez García – Prefecta.	
	Dirección o domicilio: Av. Monseñor Emilio Lorenzo Stehle s/n y Av. Esmeraldas.	
	Teléfono, fax o correo: 022762949 - 022760663	
	Supervisión: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas / Dirección De Gestión Ambiental	

2. ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en cumplimiento a sus competencias exclusivas como es el mantenimiento vial establecidas en el Art. 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, realizó el proyecto “**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS**”, ubicado en Sector Chigüilpe, perteneciente a la Parroquia Valle Hermoso en Santo Domingo de los Tsáchilas, para lo cual obtuvo el Registro Ambiental No. MAE-RA-2016-251786 emitido por la Subsecretaría de Calidad Ambiental mediante Resolución No. 211005, el 21 de julio de 2016.

De acuerdo a la información constante en el acta de entrega recepción definitiva del mencionado proyecto, se evidencia que la “**CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS - SECTOR CHIGUILPE**” se ejecutó en un plazo contractual de 150 días a **partir del 17 de noviembre de 2017 hasta el 13 de abril de 2018**.

Por lo que a los 11 días del mes de enero del 2019, se constituyen los señores: Ing. Civil Jorge Cando Herrera - Administrador del Contrato; Ing. Civil Luis Zambrano Gende - Delegado por la Dirección de Obras Públicas; Ing. Civil Gustavo Mosquera – Fiscalizador de la Obra y el Ing. Civil Robert Paul Narváez Flores - Contratista, con la finalidad de dar cumplimiento al acto de entrega recepción definitiva del puente y firman la acta dejando constancia que se ha realizado a cabalidad como se menciona en el contrato.

Mediante Oficio Nro. JNG-PREF-2020-0514, del 25 de agosto de 2020 el GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas, remite el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS - SECTOR CHIGUILPE”, periodo julio 2016 – julio 2017, sin embargo vale indicar que hubo un error en el periodo de evaluación del informe ambiental de cumplimiento presentado, ya que durante el primer año a partir de la obtención del permiso ambiental no se ejecutó la construcción del puente, esta inició en noviembre de 2017, es decir dentro del segundo periodo de evaluación julio 2017 – julio 2019, por lo que habiendo sido presentado el informe de cumplimiento se asume que corresponde al segundo periodo de evaluación julio 2017 – julio 2019, por lo que en cumplimiento a la normativa ambiental vigente a fin de estar al día con las obligaciones ambientales del Registro Ambiental No. MAE-RA-2016-251786, se elabora el presente informe ambiental de cumplimiento correspondiente al tercer periodo de evaluación julio 2019 – julio 2021.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

- ∞ Elaborar el Informe Ambiental de Cumplimiento del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS - SECTOR CHIGUILPE del periodo de evaluación Julio 2019 – Julio 2021 para presentación ante la Autoridad Ambiental.

3.2. Objetivos específicos

- ∞ Evaluar la normativa ambiental vigente relacionada con las actividades del proyecto,
- ∞ Evaluar las medidas ambientales constantes en el Plan de Manejo Ambiental
- ∞ Evaluar las obligaciones derivadas de la autorización administrativa.
- ∞ Identificar hallazgos en caso de incumplimientos y plantear un plan de acción para levantar las no conformidades identificadas durante el periodo evaluado.

4. ALCANCE.

El presente informe abarca la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente relacionada con las actividades del proyecto, medidas ambientales constantes en el Plan de Manejo Ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa del periodo Julio 2019 – Julio 2021 del "PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS"

5. METODOLOGÍA.

Se realizó la evaluación del grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, obligaciones del permiso ambiental y de las medidas del Plan de Manejo Ambiental, según los siguientes criterios:

- **CUMPLE:** Se da cuando las operaciones y actividades cumplen con las disposiciones establecidas en la ley, Plan de Manejo Ambiental.
- **NO CUMPLE. (NC-):** Cuando no se ha cumplido las medidas propuestas dentro del Plan de Manejo Ambiental como en la Normativa Ambiental vigente.
- **NO CONFORMIDAD MAYOR (NC+):** Se presenta cuando existe una falta grave al Plan de Manejo Ambiental o a la legislación ambiental vigente. Así mismo, puede darse en el caso de la acumulación de varias no conformidades menores. Se usarán los siguientes criterios:

A continuación la tabla de la que se utilizara para la verificación de las actividades propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y la normativa.

PLAN	Medida Ambiente	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO				Medios de Verificación	OBSERVACIONES
		C	NC-	NC+	N/A		
	Contenido						

6. EVALUACIÓN DE NORMATIVA AMBIENTAL PERIODO JULIO 2019 – JULIO 2021

N°	NORMATIVA	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		C	Nc-	Nc+	NA		
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, PUBLICADO EL 20 DE OCTUBRE DE 2008 - R. O. NO. 449							
1	Art 83. Inciso 6. "Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE / CAPITULO II GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS							
2	Art. 231.- Obligaciones y responsabilidades, numeral 3. Los generadores de residuos, en base al principio de jerarquización, priorizarán la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos no peligrosos, así como el adecuado manejo que incluye la separación, clasificación, reciclaje y almacenamiento temporal; en base a los lineamientos establecidos en la política nacional y normas técnicas.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE							
3	Art. 488. Informes ambientales de cumplimiento.- Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.		X			El 25 de agosto de 2020 se presentó un Informe Ambiental de Cumplimiento.	Anexo No 2: Oficio Nro. JNG-PREF-2020-0514
4	Art. 489. Periodicidad de informes ambientales de cumplimiento.- Los proyectos, obras o actividades regularizadas mediante registro ambiental deberán presentar a la Autoridad Ambiental Competente un informe ambiental de cumplimiento una vez transcurrido un (1) año desde el otorgamiento de dicha autorización administrativa y posteriormente cada dos (2) años.		X			Existió retraso en la presentación de los posteriores informes ambientales de cumplimiento.	
RESULTADOS		0	2	-	2		

7. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL REGISTRO AMBIENTAL PERIODO JULIO 2019 – JULIO 2021.

N°	NORMATIVA	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		C	Nc-	Nc+	NA		
1	Cumplir estrictamente con lo señalado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental registrado.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción
2	En caso de que la actividad productiva genere desechos peligrosos y/o especiales debe iniciar el proceso de obtención del respectivo Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o Especiales, en el término no mayor a 60 días, conforme la normativa ambiental aplicable en caso de no aplicar, se debe remitir el justificativo a esta Cartera de Estado dentro del mismo plazo.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
3	Mantener un programa continuo de monitoreo y seguimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, cuyos resultados deberán ser entregados al Ministerio del Ambiente para su respectiva evaluación o correctivos tempranos de conformidad con lo establecido en el cronograma y normativa ambiental vigente.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
4	Realizar los monitoreos de las descarga y/o emisiones conforme lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y Normativa ambiental aplicable, o cuando la Autoridad Ambiental Competente lo determine pertinente.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
5	Presentar a la Autoridad Ambiental los Informes Ambientales de Cumplimiento una vez cumplido el año de registro ambiental, y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe ambiental de cumplimiento.		X			Existió retraso en la presentación de los posteriores informes ambientales de cumplimiento.	
6	Proporcionar a la Autoridad Ambiental información veraz de todo lo declarado en el Registro y Plan de Manejo Ambiental, cuando se lo requiera.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.

7	Presentar la modificación al Plan de Manejo Ambiental si mediante cualquier medio de monitoreo, control y seguimiento la Autoridad Ambiental a través de un informe técnico sustentado así lo requiera.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
8	Proporcionar las facilidades al personal técnico de la Autoridad Ambiental Competente para llevar a cabo monitoreos, y actividades de control y seguimiento y de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental aprobado y normativa ambiental aplicable.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
9	Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel Nacional y Local.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
RESULTADOS		0	1	0	8		

8. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PERIODO JULIO 2019 – JULIO 2021.

No	MEDIDAS	EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		C	Nc -	Nc+	NA		
PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL ÁREA							
1	Desmantelamiento de todas las instalaciones del Sitio.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN							
2	Charlas sobre la prevención de riesgos, protección de recursos naturales, primeros auxilios.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
3	Capacitaciones al Personal del Trabajo.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
4	Charlas sobre seguridad industrial.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
PLAN DE CONTINGENCIAS							
5	Dotar de insumos necesarios para contrarrestar cualquier tipo de contingencias.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
6	Dotar de Equipos de protección correspondientes a los trabajadores.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
7	Dotar de sistemas de comunicación.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS							
8	Capacitaciones sobre el manejo de desechos sólidos.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
9	Manejo de los Desechos Sólidos.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
10	Clasificación de Desechos Sólidos.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO							
11	Vigilar que todas las acciones del Plan de Manejo Ambiental sean realizadas por personas capacitadas.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
12	Realizar mantenimiento continuo de vehículos.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.

13	Cumplir con las capacitaciones de riesgos laborales.				X		
PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS							
14	Adecuado almacenamiento de materiales y equipos para construcción.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
15	Control de Polvo.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
16	Compactación del suelo.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
PLAN DE REHABILITACIÓN							
17	Reforestación de áreas Afectadas.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS							
18	Capacitaciones de buenas prácticas ambientales.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
19	Charlas de Educación Ambiental.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
20	Contratación de mano de obra no calificada.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL							
21	Colocación de señalización que identifique todas las áreas según lo establece la norma INEN 439.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
22	Dotación de Equipos de Protección Personal.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
23	Capacitación al personal de trabajo.				X	La construcción del puente finalizó el 13 de abril de 2018.	Anexo No 1: Actas de entrega recepción definitiva de la obra.
RESULTADOS		0	0	0	23		

9. INTERPRETACION DE RESULTADOS


- ∞ De la evaluación de la Normativa Ambiental.- se identifican 2 No Conformidades Menores y medidas como No Aplica, en razón de que la construcción del puente finalizó en abril del 2018.
- ∞ Respecto a las Obligaciones Del Permiso Ambiental.- se identificó 1 No Conformidad menor, y 8 medidas como No Aplica en razón de que la construcción del puente finalizó en abril del 2018.
- ∞ De la misma manera de las 23 medidas contempladas dentro del plan de manejo ambiental no aplica ninguna, en razón de que para el presente periodo de evaluación la construcción del puente ya finalizó en abril del 2018.

Los resultados antes indicados se presentan en la siguiente figura y tabla resumen, con sus respectivos porcentajes.

Matriz de interpretación de resultados

ÍTEM EVALUADO	Cumplimiento C	No Conformidad Menor Nc-	No Conformidad Mayor Nc+	No aplica N/A	Total evaluado
Normativa ambiental	0	2	0	2	4
Obligaciones permiso ambiental	0	1	0	8	9
Plan de manejo ambiental	0	0	0	23	23
TOTAL	0	3	0	33	36
Porcentaje	0%	8.33 %	0 %	91.67 %	100,00 %

Interpretación de resultados

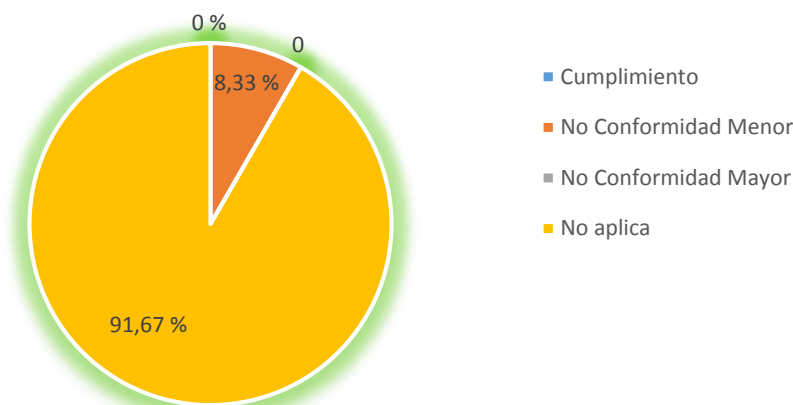

10. PLAN DE ACCIÓN

Con base en la evaluación de la normativa ambiental vigente, medidas del plan de manejo ambiental y obligaciones de la autorización administrativa ambiental, se identifican los siguientes hallazgos:

Tabla No 8 Plan de Acción

No	HALLAZGOS	MEDIDAS CORRECTIVAS	CRONOGRAMA				INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INSTRUMENTOS DE AVANCE O CUMPLIMIENTO DEL PLAN	RESPONSABLES	COSTOS
			Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4					
1	Existió retraso en la presentación del IAC y no se cumplió con la periodicidad establecida en el art. 263 del A. M 061.	Elaborar y presentar a la Autoridad los IACs retrasados a fin de estar al día con las obligaciones ambientales y seguir el trámite de ley correspondiente para la extinción del registro ambiental.	X				# de documentos presentados / # de documentos planificados	Oficios de ingreso de los IACs	Informe ambiental del cumplimiento	Dirección de Gestión Ambiental / Dirección de Obras Públicas	0.00
2	No se justificó la no construcción del puente dentro del primer periodo de evaluación julio 2016 – julio 2017 a partir de la obtención del permiso ambiental.	Elaborar documento informando que la construcción del puente inicio el 17 de noviembre de 2017 y adjuntar medios de verificación. .	X								

11. CONCLUSIONES

- ∞ Se ha desarrollado el presente informe ambiental de cumplimiento con la finalidad de cumplir con la normativa ambiental vigente y estar al día con las obligaciones ambientales y de esta manera obtener la extinción de la Autorización Administrada Ambiental del Proyecto de CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS - SECTOR CHIGUILPE, por cuanto la fase de construcción del puente ya culminó, conforme se puede evidenciar en la documentación citada y adjunta.

12. ANEXOS

ANEXO NO 1: ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA



**DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS
JEFATURA DE FISCALIZACION**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

CONTRATO N°.- 096-GADPSDT-JCP-2017
CONTRATISTA: Ing. Civil Robert Paul Narváez Flores
OBRA: "Construcción del puente sobre el río Como Hacemos sector Chiguilpe, parroquia Valle Hermoso".
UBICACIÓN: Parroquia Valle Hermoso – Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas.

En la ciudad de Santo Domingo a los once días del mes de enero del año dos mil diecinueve, nos constituimos por una parte los señores: Ing. Civil Jorge Cando Herrera ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Ing. Civil Luis Zambrano Gende DELEGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, Ing. Civil Gustavo Mosquera Vargas, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (E) FISCALIZADOR DE LA OBRA QUE ACTUA COMO OBSERVADOR y por otra parte el Ing. Civil Robert Paul Narváez Flores CONTRATISTA, con la finalidad de dar cumplimiento al acto de entrega recepción definitiva, del contrato suscrito el 16 de noviembre del 2017; haciendo constar para el efecto el siguiente contenido:

PRIMERA. - ANTECEDENTES. -

1.1	CONTRATANTE	GAD Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas
1.2	PROCESO DE CONTRATACIÓN	COTO-GADPSDT-01-2017
1.3	NUMERO DE CONTRATO	096-GADPSDT-JCP-2017
1.4	OBJETO DEL CONTRATO	"Construcción del Puente sobre el río Como Hacemos sector Chiguilpe, parroquia Valle Hermoso.
1.5	UBICACIÓN	Parroquia Valle Hermoso - Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
1.6	CONTRATISTA	Ing. Robert Paul Narváez Flores
1.7	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	16 de noviembre de 2017
1.8	MONTO DEL CONTRATO USD.	585.715,02
1.9	FINANCIAMIENTO	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BP
1.10	PLAZO	150 días calendario
1.11	FECHA ENTREGA ANTICIPO	27 de noviembre del 2017
1.12	FECHA INICIO TRABAJOS	17 de noviembre de 2017
1.13	FECHA VENCIMIENTO DEL PLAZO	15 de abril de 2018
1.14	PRORROGA DE PLAZO	Ninguna
1.15	FECHA DE TERMINACIÓN	13 de abril de 2018 (OFICIO N°. - 021-2018-RN)

ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA- "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COMO HACEMOS – SECTOR CHIGUILPE, PARROQUIA DE VALLE HERMOSO - CONTRATISTA: ING. ROBERT P. NARVÁEZ FLORES. 2019



**DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS
JEFATURA DE FISCALIZACION**

1.16	MULTAS	Ninguna
1.17	CONTRATO COMPLEMENTARIO	Ninguno
1.18	FISCALIZADOR	Ing. Gustavo Mosquera Vargas
1.19	ADMINISTRADOR	Ing. Jorge Cando Herrera

SEGUNDA. – PERSONAL TÉCNICO EMPLEADO

N.-	Nombre Completo	Función	Participación (Días)
1	Ing. Yuri Fidel Castro Torres	Super Intendente de obra	75
2	Ing. José Ramos Vidal	Residente de Obra	150
3	Ing. Manuel Reyes Barreto	Residente Estructural	45
4	Ing. José Benjamín Zambrano Álava	Ingeniero en Medio Ambiente	105

TERCERA. - INSPECCIÓN DE LA OBRA.

Para efecto de la recepción, los comparecientes en conocimiento del objeto del contrato, en unidad de acto proceden a recorrer íntegramente la construcción de la obra contratada, para dejar constancia del cumplimiento del contrato.

Se realiza la inspección y verificación física el 09/enero/2019.

CUARTA. - EVALUACIÓN ECONÓMICA.

EL GAD PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, efectuó el siguiente movimiento económico, para pagar las planillas por trabajos ejecutados, de acuerdo al siguiente desglose:

CUADRO: DETALLE DE MONTOS PLANILLADOS

PLANILLAS	ANTICIPO	MONTO DEL CONTRATO (USD.)				%
		TOTAL PLANILLADO	DESCUENTO ANTICIPO	REAJUSTES	LIQUIDO AL CONTRATISTA	
ANTICIPO	117.143,00			117,15		
PLANILLA N°.- 1		203.559,88	40.711,98	162,85	163.010,75	34,75
PLANILLA N°.- 2		112.629,50	22.525,90	-270,31	89.833,29	19,23
PLANILLA N°.- 3		136.815,60	27.363,12	-437,81	109.014,67	23,36
PLANILLA N°.- 4		89.245,94	17.849,19	142,79	71.539,54	15,24
PLANILLA N°.- 5		32.467,44	8.692,81	3,02	23.777,65	5,54
TOTAL USD=		574.718,36	117.143,00	-282,31	457.175,90	98,12

ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA- "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COMO HACEMOS – SECTOR CHIGUILPE, PARROQUIA DE VALLE HERMOSO - CONTRATISTA: ING. ROBERT P. NARVÁEZ FLORES. 2019



**DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS
JEFATURA DE FISCALIZACION**

QUINTA. – CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN	MONTO (USD)	%
MONTO DE CONTRATO:	585.715,02	100,00%
RUBROS CONTRACTUALES	530.686,38	90,60%
ORDEN DE CAMBIO	44.031,98	7,52%
ORDEN DE TRABAJO		
TOTAL PLANILLADO	574.718,36	98,12%

3

SEXTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

FIRMA DEL CONTRATO:	16 NOVIEMBRE DE 2017
PLAZO CONTRACTUAL:	150 DÍAS CALENDARIO
ENTREGA DEL ANTICIPO:	27 NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:	17 NOVIEMBRE DE 2017
SUSPENSIÓN DE LA OBRA:	NO EXISTE
TERMINO CONTRACTUAL:	15 ABRIL DE 2018
FECHA REAL QUE TERMINO:	13 ABRIL DE 2018
MORA:	NO EXISTE

SÉPTIMA. - EVALUACIÓN DE TRABAJOS.

Las características constructivas son las que constan en el contrato original vigente, y los volúmenes y cantidades de obra ejecutadas y liquidadas constan en la respectiva Planilla de Liquidación.

Volúmenes de obra ejecutados:

No.	RUBROS:	CONTRATADO:				EJECUTADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD	CANCELADO
	OPERACIONES PRELIMINARES						
1	DESBROCE, DESBOQUE Y LIMPIEZA	m2	60,00	1,11	66,60	473,16	525,21
2	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	ha	0,04	2.026,64	81,07	0,07	141,86
3	REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	glb	1,00	9.628,80	9.628,80	1,00	9.628,80
4	EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN CLASIFICAR	m3	1.620,00	2,20	3.564,00	1.136,13	2.499,49
5	ESCOLLERA DE PIEDRA SUELTA CON REVESTIMIENTO FRONTAL DE H.S. 210 KG/CM2 E=15CM + MALLA ELECTROS 8X15	m3	600,00	71,82	43.092,00	0,00	0,00
	ACCESO A PUENTE CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIAS						
	TERRACERÍA						

ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA- "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COMO HACEMOS – SECTOR CHIGUILPE, PARROQUIA DE VALLE HERMOSO - CONTRATISTA: ING. ROBERT P. NARVÁEZ FLORES. 2019



**DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS
JEFATURA DE FISCALIZACION**

6	BADEN DE PIEDRA	m3	320,00	14,99	4.796,80	970,72	14.551,09
7	MEJORAMIENTO DE CAPA DE RODADURA	m3	200,00	11,68	2.336,00	437,42	5.109,07
CALZADA							
8	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO D=1,20 M E=2,5 MM	m	32,00	301,26	9.640,32	21,00	6.326,46
9	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	768,00	5,50	4.224,00	1.342,16	7.381,88
10	MEJORAMIENTO DE SUELO DE CIMENTACIÓN CON SUB BASE III ESTABILIZADA CON CEMENTO PORTLAND	m3	214,64	65,21	13.996,67	199,00	12.976,79
11	GEOTEXTIL NT 1600	m2	720,00	1,17	842,40	0,00	0,00
12	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS F'Y=4200 KG/CM2	kg	16.657,36	2,09	34.813,88	15.839,66	33.104,89
13	HORMIGÓN ESTRUCTURAL CLASE "B" F'C=240 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)	m3	184,02	242,11	44.553,08	180,58	43.720,22
14	HORMIGÓN ESTRUCTURAL CLASE C (F'C=180 KG/CM2) INC. ENCOFRADO	m3	5,23	239,83	1.254,31	9,12	2.187,25
15	MATERIAL FILTRANTE	m3	9,40	25,23	237,16	0,00	0,00
16	SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588	kg	60.277,48	2,54	153.104,80	63.506,92	161.307,58
ENLACE DERECHO							
TERRACERÍA							
17	FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588	kg	60.277,48	1,23	74.141,30	63.506,92	78.113,51
18	MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588	kg	60.277,48	1,30	78.360,72	63.506,92	82.559,00
19	SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL TIPO A-36	kg	4.734,53	1,86	8.806,23	6.354,83	11.819,98
20	FABRICACIÓN ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36	kg	4.734,53	1,23	5.823,47	6.354,83	7.816,44
CALZADA							
21	MONTAJE ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36	kg	4.734,53	1,30	6.154,89	6.354,83	8.261,28
22	LIMPIEZA Y PINTURA ANTICORROSIVA DE ACERO ESTRUCTURAL	kg	65.012,01	0,23	14.952,76	69.861,75	16.068,20
23	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS F'Y=4200 KG/CM2	kg	10.200,19	2,09	21.318,40	12.355,62	25.823,25
24	HORMIGÓN ESTRUCTURAL CLASE "A" F'C=280 KG/CM2 (INC. ENCOFRADO)	m3	93,32	263,12	24.554,36	97,07	25.541,06
25	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ESTRUCTURAL F'C=350 KG/CM2	m2	10,26	21,42	219,77	0,00	0,00
26	PLACAS DE NEOPRENO DUREZA SHORE 70 (40X40X4) CM	u	8,00	295,47	2.363,76	8,00	2.363,76
27	ALIVIANAMIENTO DE MADERA CONTRACHAPADA E=9 MM	m	70,30	33,41	2.348,72	69,60	2.325,34
28	JUNTAS DE DILATACIÓN TIPO III MOP	m	14,40	116,87	1.682,93	14,40	1.682,93
DRENAJE							
29	TUBO PVC 4" PARA DRENAJE	m	25,40	8,09	205,49	21,60	174,74
30	SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA (0.75X0,75 M) REGLAMENTARIA	u	4,00	192,03	768,12	4,00	768,12
31	SEÑAL AL LADO DE LA CARRETERA (0.60X1.20 M)	u	6,00	207,57	1.245,42	6,00	1.245,42
32	TACHAS REFLECTIVAS	u	18,00	4,47	80,46	18,00	80,46
33	ADHESIVOS REFLECTIVOS 15X5 CM	u	30,00	2,29	68,70	30,00	68,70
34	PINTURA AMARILLA SEÑALIZACIÓN	m2	30,10	6,79	204,38	89,64	608,66
35	RELLENO Y CONFORMACIÓN DE ACCESOS	m3	2.000,00	6,29	12.580,00	1.579,80	9.936,94
36	PRUEBA DE CARGA	u	1,00	3.603,25	3.603,25		
TOTAL					585.715,0200		574.718,39

ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA- "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COMO HACEMOS - SECTOR CHIGUILPE, PARROQUIA DE VALLE HERMOSO - CONTRATISTA: ING. ROBERT P. NARVÁEZ FLORES. 2019




DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS
JEFATURA DE FISCALIZACION


OCTAVA. - ACUERDOS

Una vez realizado por parte de los miembros de la Comisión, un recorrido por todo lo que comprende la obra, se constata que la misma no presenta daños o fallas constructivas a simple vista, y que el puente está prestando el servicio para lo que fue construido; la comisión declara su conformidad con la ejecución de la obra objeto de esta recepción, en consecuencia, se da por Recibida Definitivamente la obra.


Para constancia y fe de lo actuado, la comisión designada para el acto de recepción definitiva, firma la presente acta en original y cinco copias de igual tenor y contenido.



Ing. Civil Jorge Cando Herrera
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Civil Luis Zambrano Gende
DELEGADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS



Ing. Civil Gustavo Mosquera Vargas
DIRECTOR DE OO-PP (E)
FISCALIZADOR-OBSERVADOR



ACTA RECEPCIÓN DEFINITIVA- "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO COMO HACEMOS – SECTOR CHIGUILPE,
PARROQUIA DE VALLE HERMOSO - CONTRATISTA: ING. ROBERT P. NARVÁEZ FLORES. 2019

ANEXO NO 2: Oficio Nro. JNG-PREF-2020-0514 / INGRESO DE PRIMER IAC PERIODO JULIO 2017 – JULIO 2019



Oficio No. JNG-PREF-2020-0514 2
Santo Domingo, 25 de agosto del 2020

Señora Ingeniera,
Andrea Tenorio Obando
RESPONSABLE DE OFICINA TÉCNICA SANTO DOMINGO
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA

De mi consideración,

Reciba un cordial saludo en conjunción con mis deseos de éxito en sus funciones profesionales.

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 488 del Código Orgánico de Ambiente, el cual dispone:

“Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo a los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional.

Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.


Los operadores deberán cancelar los valores por servicios administrativos y adjuntar las respectivas facturas de pago de tasas administrativas al momento de la presentación del informe ambiental de cumplimiento”.

A través del presente me permito remitir el link a través del cual podrá encontrar el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto **“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE COMO HACEMOS – SECTOR CHIGUILPE”** con código MAE-RA-2016-251786, para la revisión y aprobación de su representada Cartera de Estado.

Link: <https://1drv.ms/u/s!Ar6yPkkTag6wl3MeYytdKun3NZ-t?e=Z6sYCF>.

Sin otro particular, anticipo mi agradecimiento por la atención que se le destine al presente.

Atentamente,



Ab. Johana Nuñez Garcia
PREFECTA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS**

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
SECRETARÍA

27 AGO 2020

DOCUMENTO RECIBIDO
Mauri Aparicio
FUNCIONARIO QUE RECIBE

CON ANEXOS	<input type="checkbox"/>
SIN ANEXOS	<input type="checkbox"/>
